

Filtre région

Filtrer par mot clé

→

Filtre pays

Filtrer par mot clé

→

Filtre projet

Filtrer par mot clé

→


Type de projet

▼


☒ IT - CRM Implementation

☒ Marketing - Launch of new product


Répartition des projets par pays et niveaux de retard

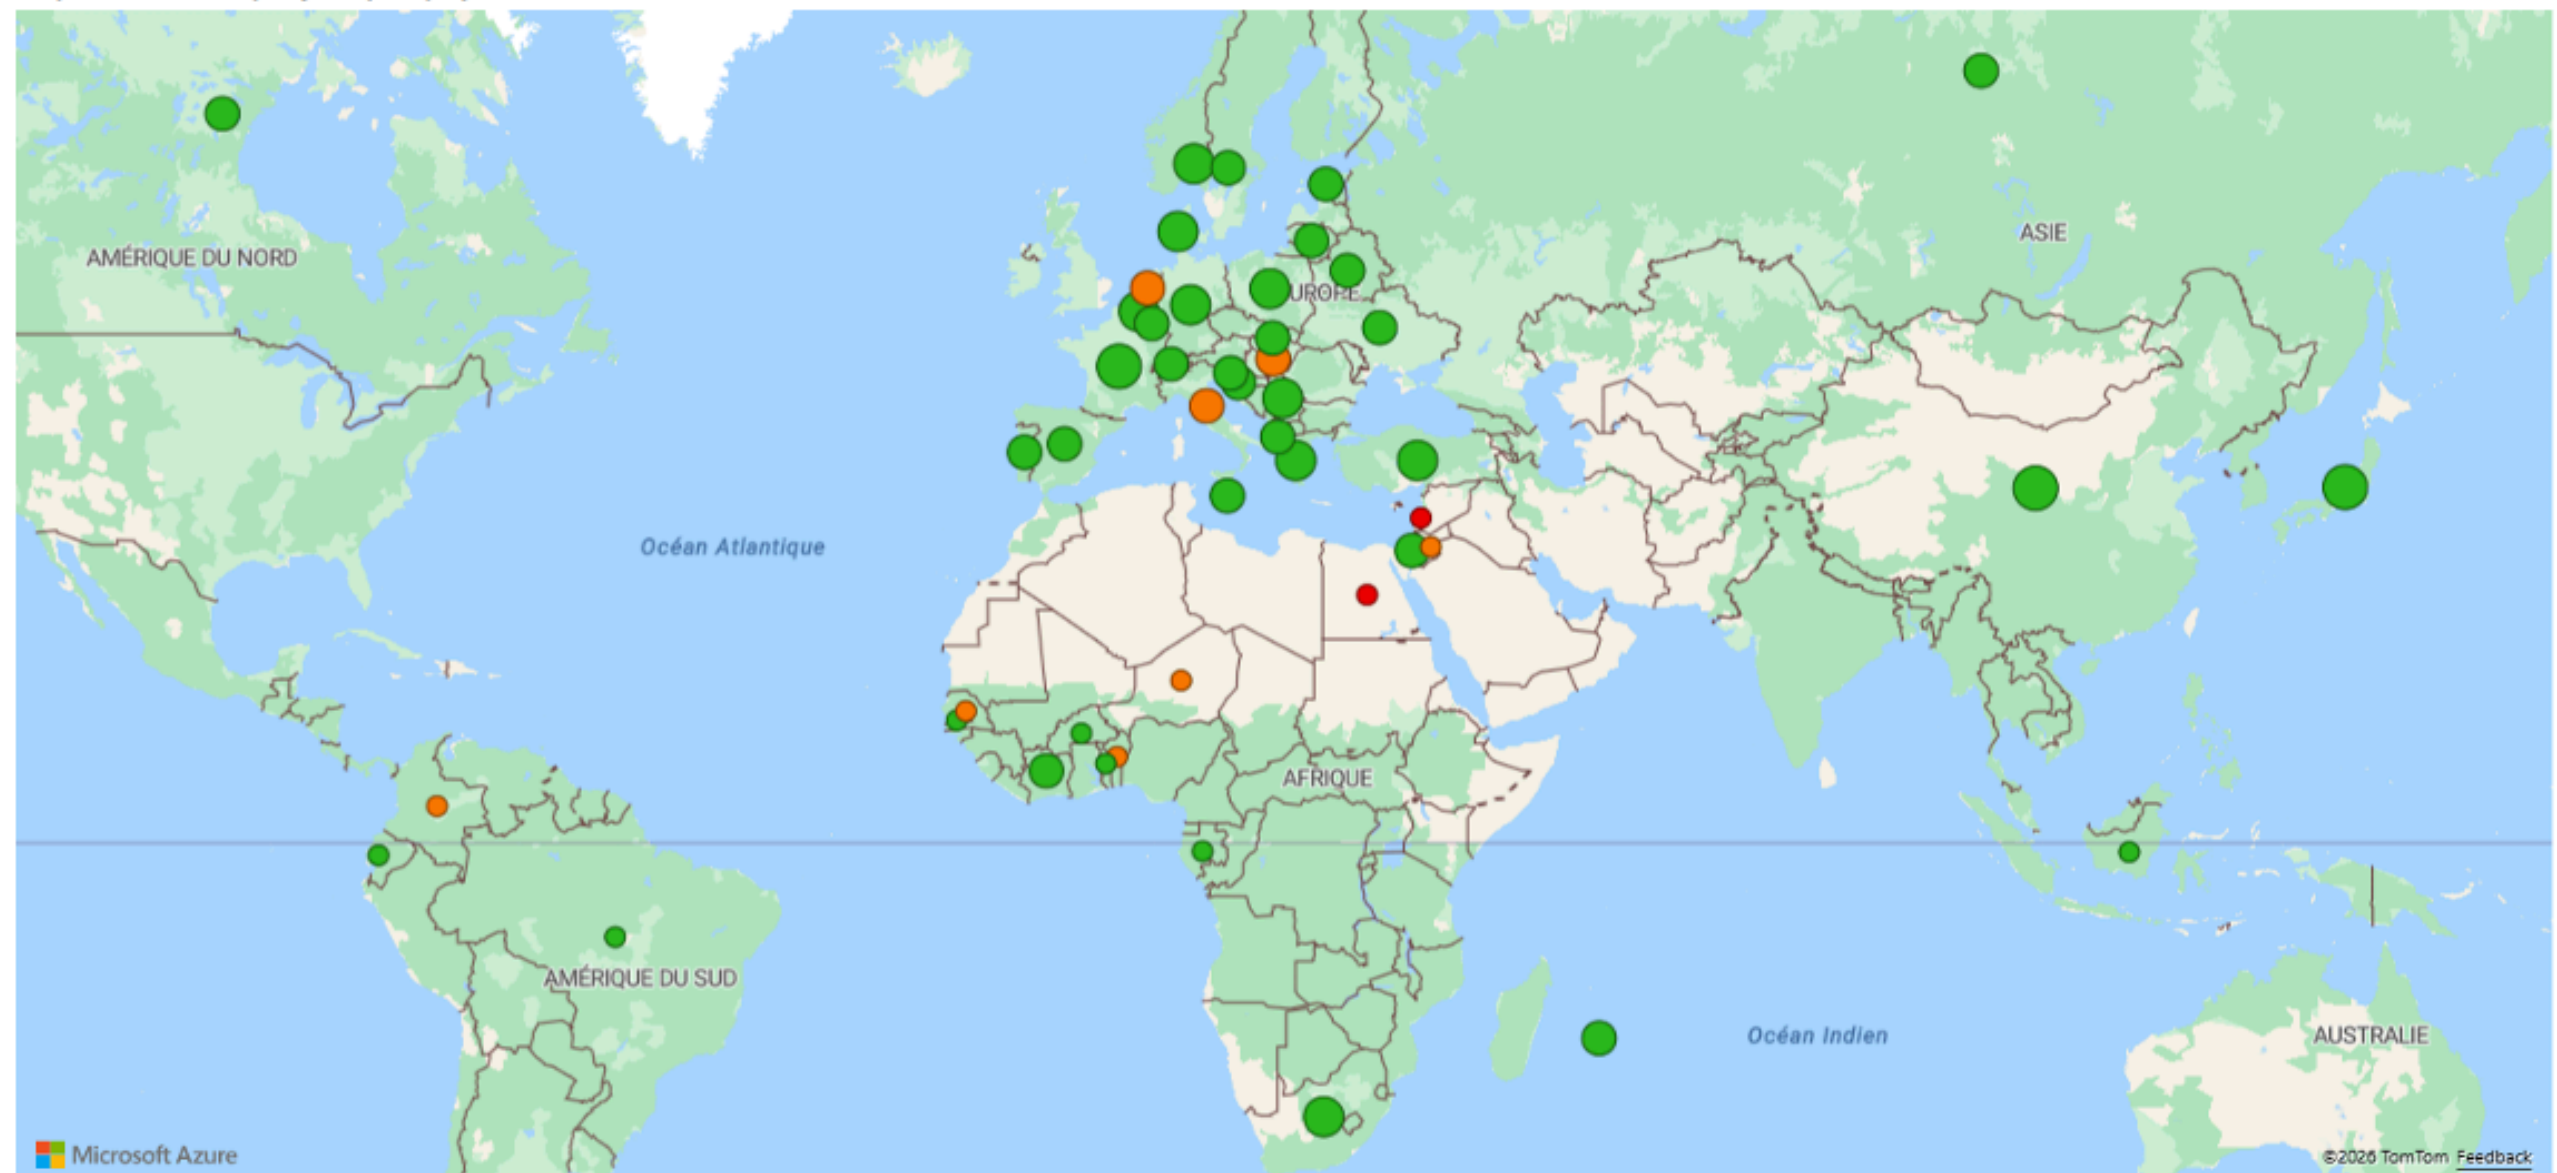


Consommation du budget prévisionnel mondial

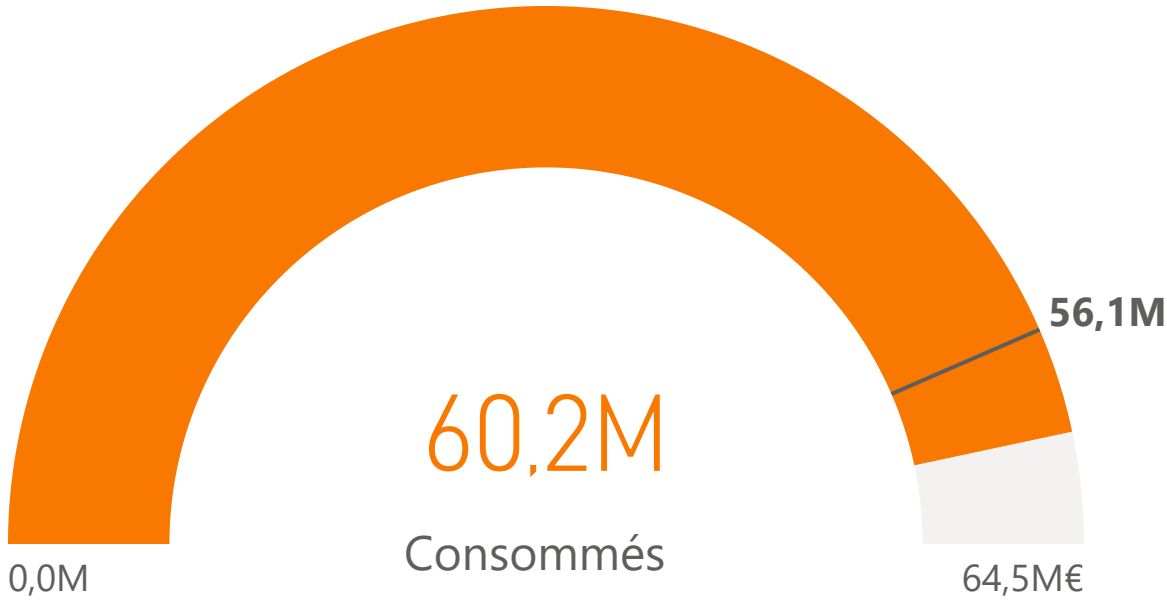


Consommation des budgets prévisionnels régionaux

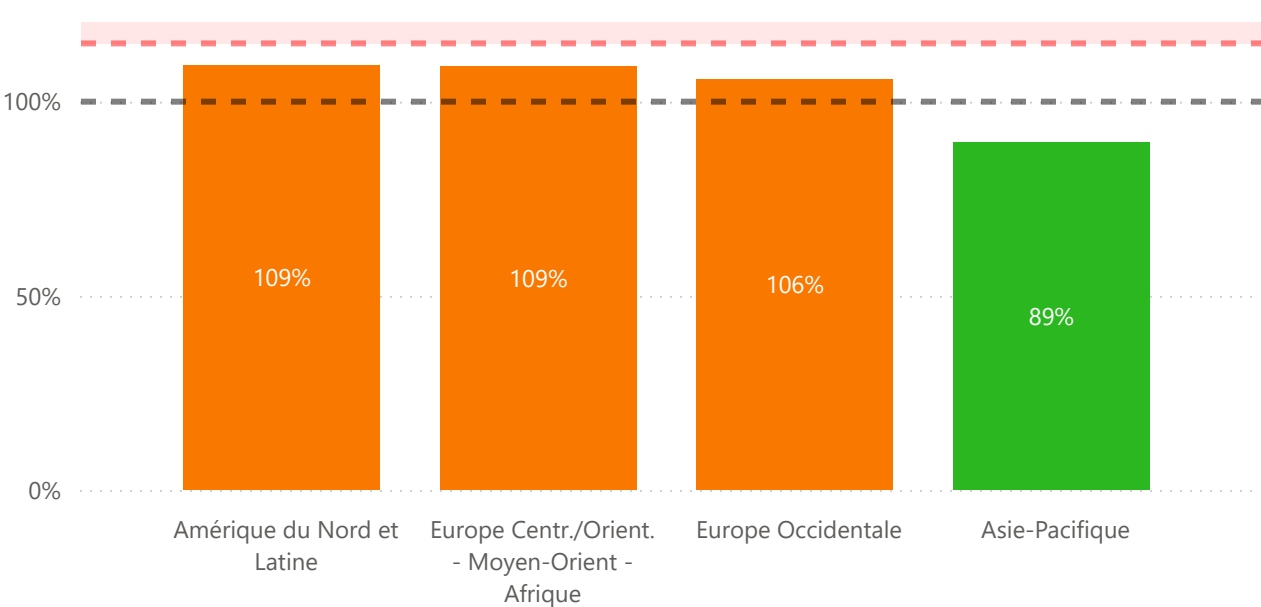

Consommation des ressources temps prévisionnelles régionales

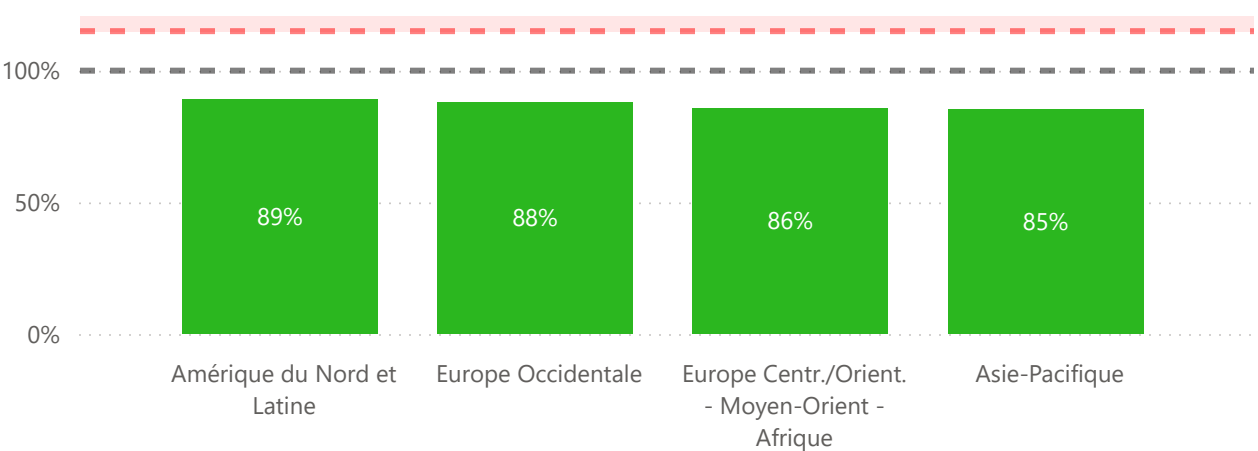

Production des livrables prévisionnels régionaux

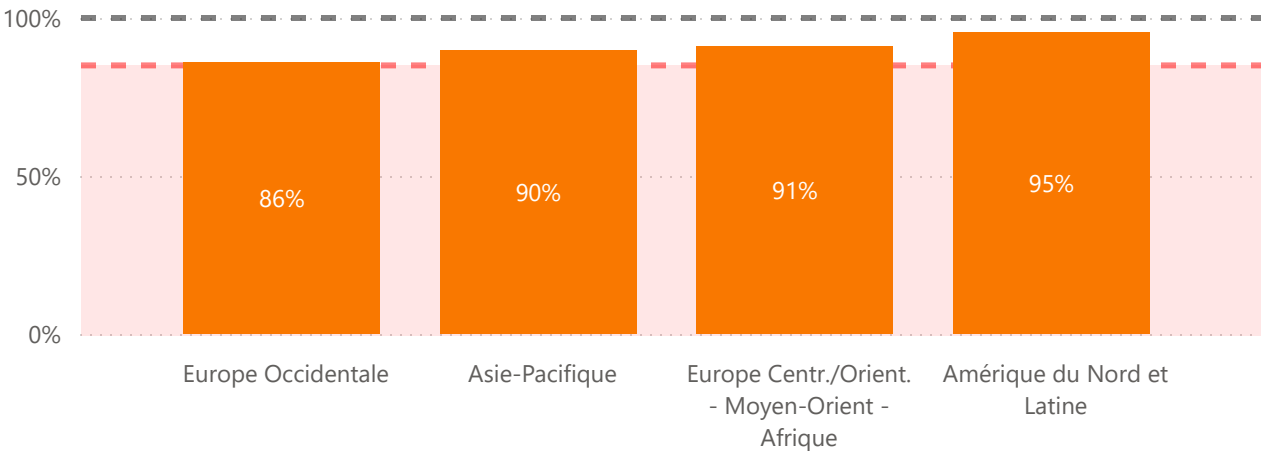

Type de projet

- ✓ IT - CRM Implementation
- ✓ Marketing - Launch of new product


Région

Budget	Délais	Livrables	Niveau de criticité
Amérique du Nord et Latine			
Europe Centr./Orient. - Moyen-Orient - Afrique			
Europe Occidentale			
Asie-Pacifique			


- Respect du prévisionnel
- <15% d'écart avec le prévisionnel
- +15% d'écart avec le prévisionnel

- 100% du prévisionnel
- Zone d'alerte

Consommation du budget régional

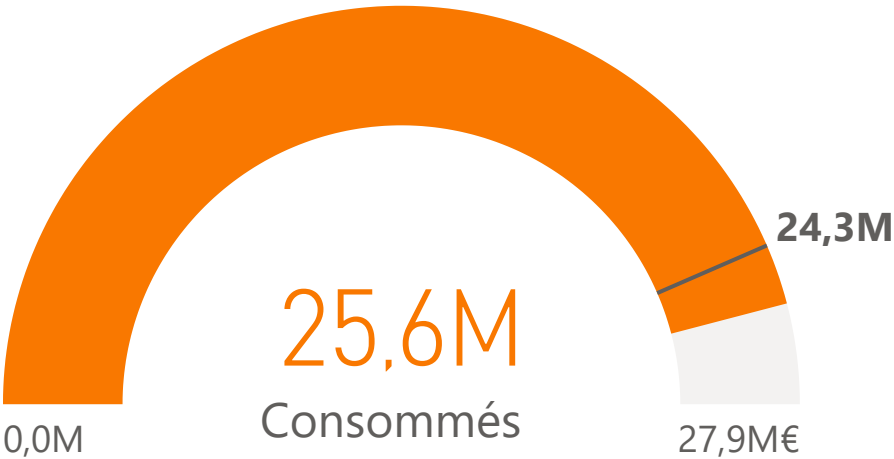

Consommation des budgets prévisionnels nationaux

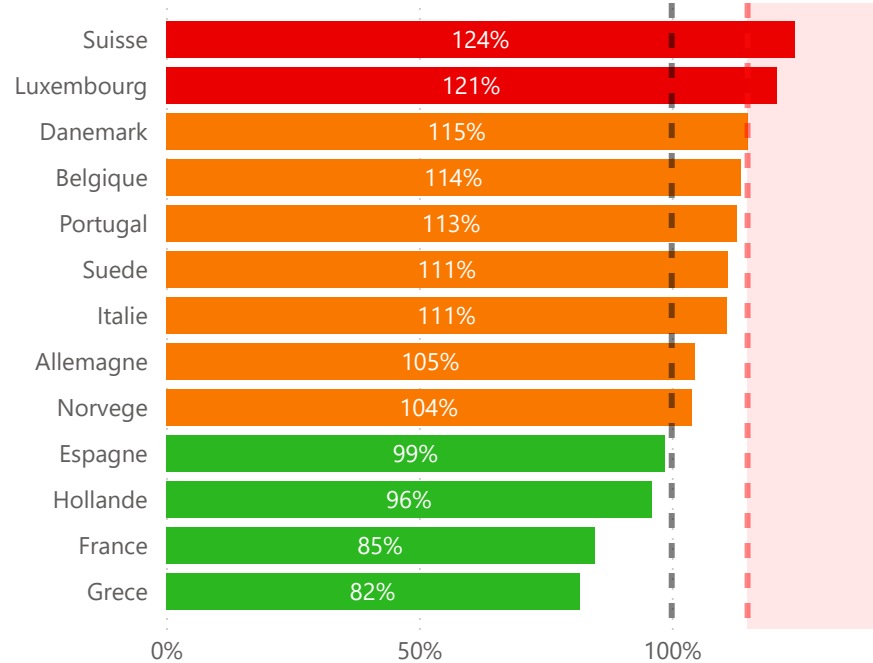

- Amérique du Nord et Latine
- Asie-Pacifique
- Europe Centr./Orient. - Moyen-Orient - Afrique
- Europe Occidentale

Premiers


Derniers

Tous


Type de projet

- ✓ IT - CRM Implementation
- ✓ Marketing - Launch of new product

Consommation des ressources temps prévisionnelles nationales

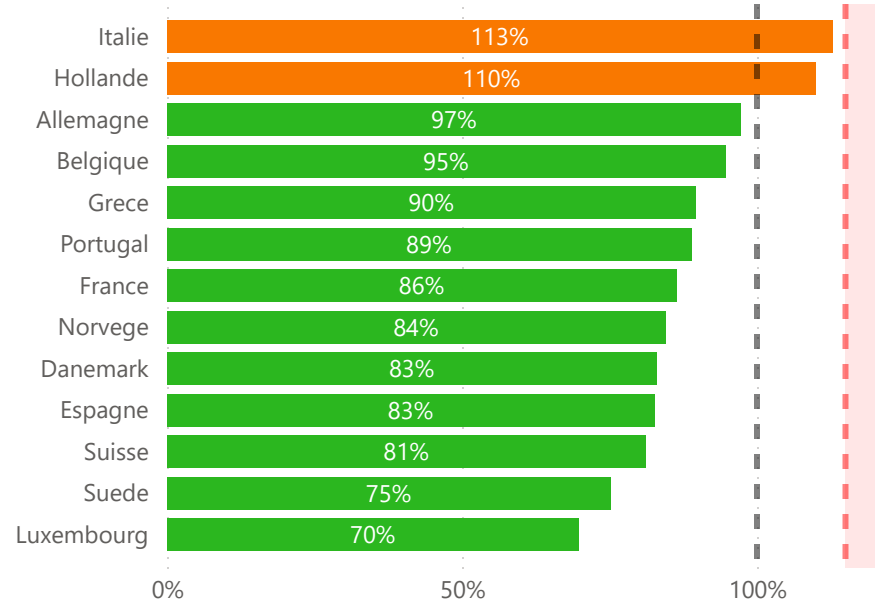

Production des livrables prévisionnels nationaux

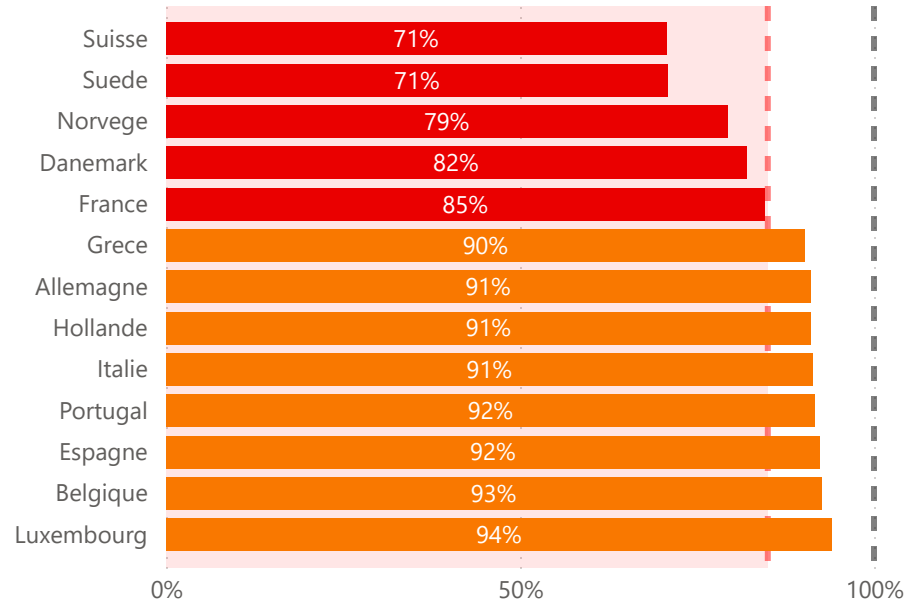


Pays	Budget	Délais	Livrables	Alerte
Suisse				
Luxembourg				
Danemark				
Norvege				
Suede				
France				
Italie				
Allemagne				
Belgique				
Portugal				
Hollande				
Espagne				
Grece				


- Respect du prévisionnel
- <15% d'écart avec le prévisionnel
- +15% d'écart avec le prévisionnel

- 100% du prévisionnel
- Zone d'alerte

Consommation du budget prévisionnel national

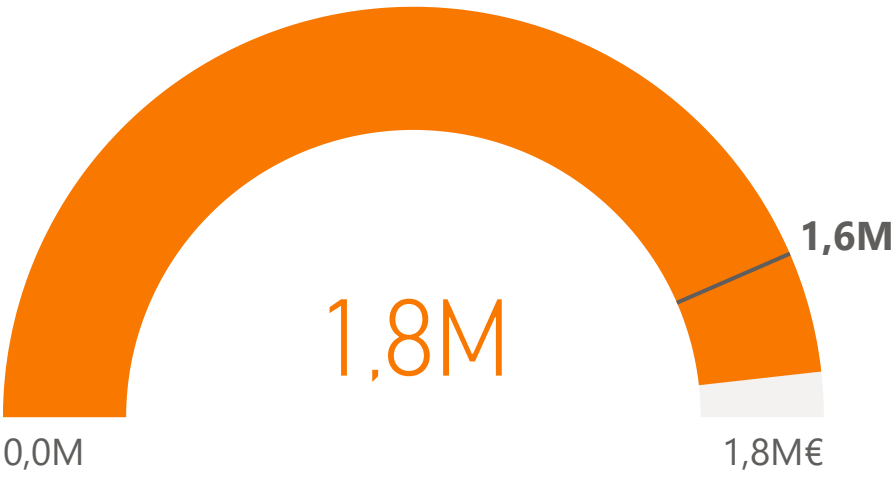

Consommation des budgets prévisionnels projets

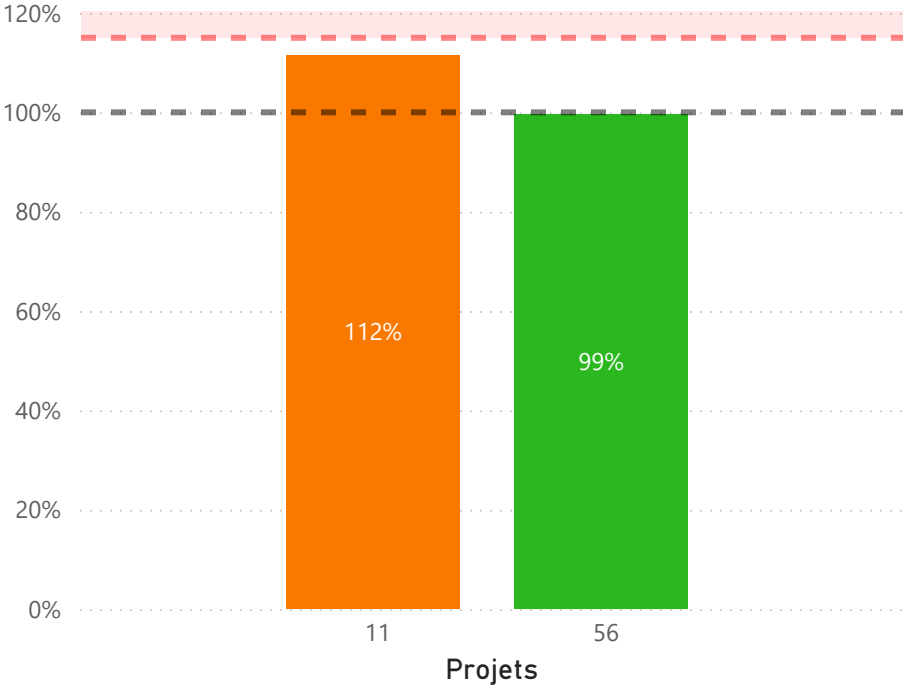

Pays


▼

Entrée Pays


→

- ☐ Afrique du Sud
- ☐ Albanie
- ☐ Allemagne
- ☐ Belgique
- ☐ Benin
- ☐ Bielorussie


Répartition des projets par types



Consommation des ressources temps prévisionnelles projets

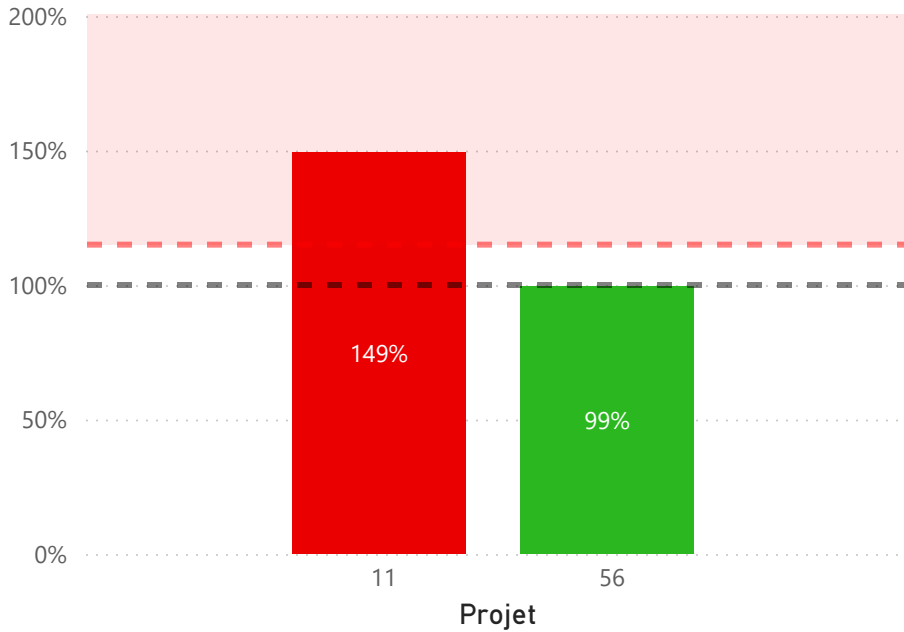

Production des livrables prévisionnels projets

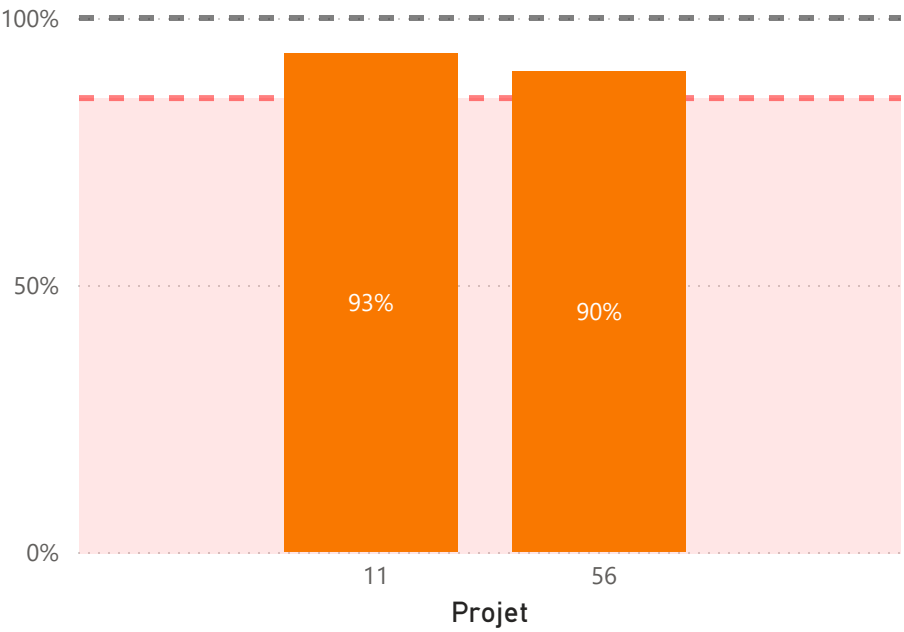

Projet	Budget	Délais	Livrables	Alerte
11				
56				

- Respect du prévisionnel
- <15% d'écart avec le prévisionnel
- +15% d'écart avec le prévisionnel
- 100% du prévisionnel
- Zone d'alerte

Analyse :

Un seuil d'alerte uniformisé (15%).

Des inégalités de performance suivant les régions, pays et les types de projets (ex. : des projets IT avec un budget moins conséquent que les projets marketing mais beaucoup mieux maîtrisé dans l'ensemble).

Une faiblesse significative et généralisée sur la performance de production des livrables.

Un déséquilibre de charge notable entre les régions (ex. : beaucoup plus de pays à piloter pour Europe Centr./Orient. - Moyen-Orient - Afrique).

Proposition d'axe stratégique :

Se servir de ces tableaux de bord comme un déclencheur d'actions immédiates en optimisant la chaîne décisionnelle et en réduisant la latence entre la détection d'un problème et la mesure corrective.

Cela permet de passer d'un mode de gestion réactif (constat des retards) à un mode proactif en systématisant les actions dès que les indicateurs montrent des faiblesses.

Product Strategy Canvas

Rédacteur	Florian Mounier, ESN Data	Date	26/12/2025	Nom du client	Sophie, cheffe de projet au sein du service Project Management Office de Sanitoral
-----------	------------------------------	------	------------	---------------	--

Nom du tableau de bord : Performance Projets IT et Marketing	Objectif du dashboard : Suivi des projets et des coûts ; identification des retards ; contrôle des performances et sécurisation de la valeur
--	--

Utilisateurs	Stories		
Directeur Général	1. En tant que DG, je souhaite voir le budget total consommé comparé au prévisionnel afin d’orienter mes décisions stratégiques. 2. En tant que DG, je souhaite comparer le budget et l'avancement des livrables par région pour challenger les directeurs régionaux. 3. En tant que DG, je souhaite localiser visuellement les pays en retard critique pour réduire la latence de l'intervention corrective. 4. En tant que DG, je souhaite identifier les disparités de performance entre projets IT et Marketing pour transférer les bonnes pratiques de gestion.		
	Décide de la stratégie générale : Arbitre le maintien ou l'arrêt des investissements basés sur la règle des 15% d'écart	Challenge les Directeurs Régionaux : Identifie les zones de surcharge ou de faiblesse de production.	Réduit la latence décisionnelle : Identifie immédiatement les régions en souffrance pour exiger des mesures correctives rapides.
Directeur Région	1. En tant que DR, je souhaite comparer le budget réel au prévisionnel par pays pour réallouer les ressources et experts là où le besoin est critique. 2. En tant que DR, je souhaite suivre le respect des deadlines et l'avancement des livrables par pays pour identifier les faiblesses opérationnelles locales et challenger les DP. 3. En tant que DR, je souhaite être alerté immédiatement des dérives critiques pour remonter les informations pertinentes au DG et réduire la latence de traitement. 4. En tant que DR, je souhaite analyser la performance par type (IT vs Marketing) pour comprendre si les retards sont liés à une surcharge de pilotage ou à une expertise spécifique.		
	Gère l'ensemble des pays de sa région : Réalloue les budgets et experts en fonction des alertes budgétaires dépassant le seuil de 15%. Fait le lien entre stratégie et opération : Détecte si le déséquilibre de charge (nb de pays/projets par région) impacte la qualité de livraison.	Challenge les Directeurs Pays (DP) : Intervient immédiatement auprès des DP dès qu'un projet affiche un retard de production de livrables.	Remonte les alertes au DG : Escalade les projets critiques dont les mesures correctives locales ne suffisent pas à ramener l'écart sous les 15%.
Directeur Pays	1. En tant que DP, je souhaite comparer le budget consommé au prévisionnel de mon pays pour prendre des décisions budgétaires locales rapides. 2. En tant que DP, je souhaite voir la répartition des projets (IT vs Marketing) pour orienter mes ressources vers les types de projets les mieux maîtrisés. 3. En tant que DP, je souhaite voir la performance de production des livrables par projet pour redresser la faiblesse générale identifiée. 4. En tant que DP, je souhaite suivre précisément la tenue des délais par projet pour identifier les risques terrain avant qu'ils ne remontent au niveau régional.		
	Gestion opérationnelle et corrective : Prend des mesures correctives immédiates dès qu'un projet franchit le seuil de 15% d'écart budgétaire.	Challenge les Chefs de Projet : Assure la livraison effective en validant les jalons et en surveillant l'écart de production de livrables.	Identifie les risques terrain : Analyse les causes de retard et ajuste la taille des équipes ou le planning.
